



津興橋大規模更新事業(津興橋の架け替え(更新)工事)

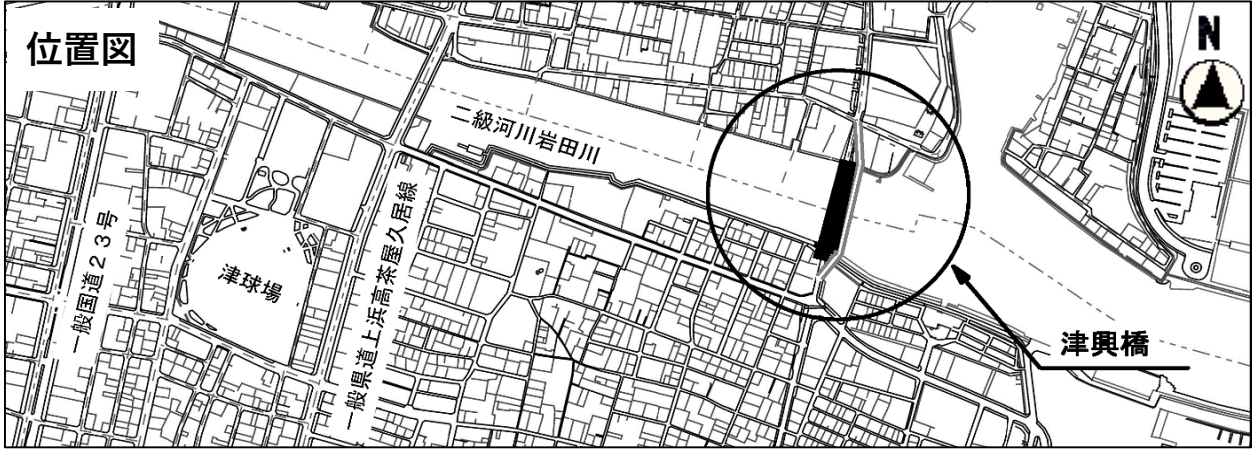

新橋 道路形態 **令和8年度 完成予定**

令和8年度 完成予定

架け替え前

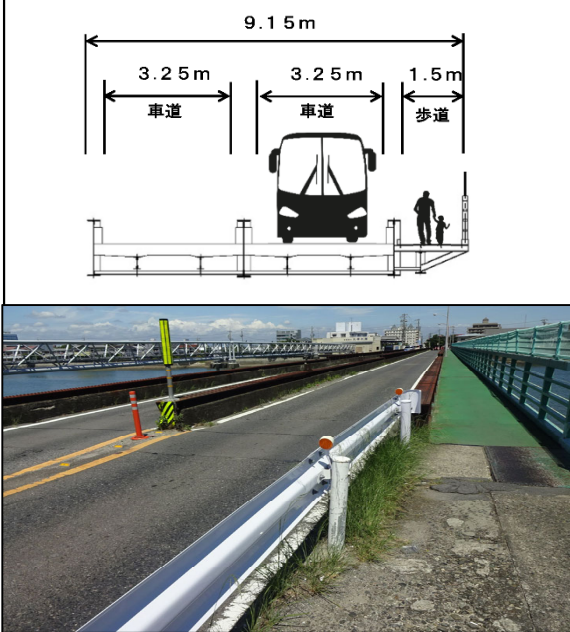


歩道の幅を広げます

両側に歩道を設置します

両側に路肩を設置します

架け替え後

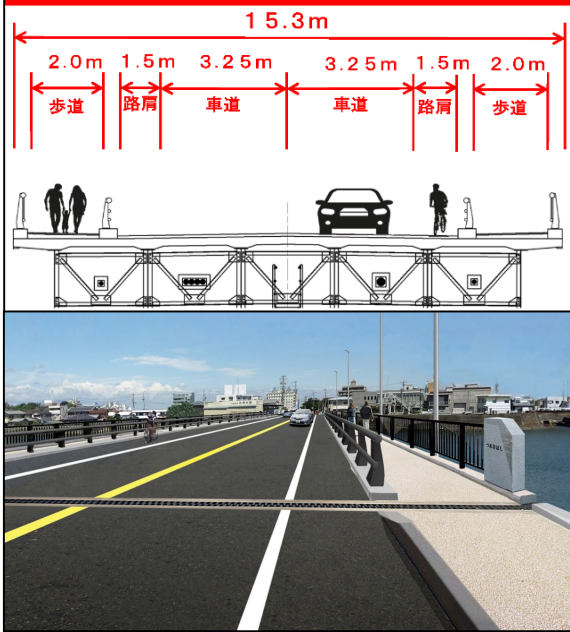[illegible]

津興橋大規模更新事業(津興橋の架け替え(更新)工事)

現場作業進捗状況



現場着手前

既設橋の下流側に迂回路仮橋・工事用仮橋を設置する工事を発注しました。【受注者:大豊・三重農林JV】



迂回路仮橋・工事用仮橋設置作業

迂回路仮橋・工事用仮橋を設置する作業を進めました。(鋼管杭の打込、覆工板の設置)



迂回路仮橋・工事用仮橋設置作業

迂回路仮橋・工事用仮橋を設置する作業を進めました。(鋼管杭の打込、覆工板の設置完了)



迂回路仮橋・工事用仮橋設置作業

迂回路仮橋・工事用仮橋を設置する作業を進めました。(現道への取付部分(迂回路)の作業)



迂回路仮橋・工事用仮橋工事完了

令和元年12月24日に本線の切替を行い、工事が完了しました。



既設上部工撤去作業中

既設橋の上部工を撤去する工事を発注しました。【受注者:中部産業(株)】

津興橋大規模更新事業(津興橋の架け替え(更新)工事)

現場作業進捗状況



現場着手前

上部工撤去後、既設橋台1基と既設橋脚3基(全体の半分)の撤去及び、新設橋台1基の設置工事を発注しました。【受注者:奥村・藪JV】



既設橋脚締切作業

既設橋脚3基をブロックに分割し撤去する作業を進めました。



既設橋脚撤去完了

既設橋脚3基をブロックに分割し撤去する作業が完了しました。(6基のうち3基)



既設橋脚撤去作業

残りの既設橋脚3基を撤去するための工事を発注しました。【受注者:(株)奥村組】
写真は、撤去に向けた準備作業中です。



既設橋脚撤去作業

河川内に鋼矢板を打込み、既設橋脚3基を締切る作業を進めました。(締切作業は12月末完了)



既設橋脚撤去完了

残りの既設橋脚3基をブロックに分割し撤去する作業が完了しました。

津興橋大規模更新事業(津興橋の架け替え(更新)工事)

現場作業進捗状況

令和4年8月



現場着手前

既設橋台1基の撤去と、新設橋台1基及び新設橋脚3基の設置工事を発注しました。
【受注者:大豊・丸新JV】

令和4年11月



河川内締切作業

新設橋脚設置に向けて河川内作業に着手しました。(3基のうち1基)

令和4年12月



新橋脚 場所打ち杭作業

新設橋脚の基礎となる杭の設置作業を進めました。

令和5年3月



河川内二重締切作業

河川内に鋼矢板を打込み、新設橋台を構築するための準備を進めました。

令和5年6月



旧橋台 撤去作業

新設橋脚(3基のうち1基)の構築作業が完了
新橋台を構築するために必要な旧橋台の撤去作業を進めています。

令和5年10月



新橋台 場所打ち杭作業

新設橋台の基礎となる杭の設置作業を進めています。

津興橋大規模更新事業(津興橋の架け替え(更新)工事)

現場作業進捗状況



新橋台、橋脚の構築及び護岸復旧

新設橋台と橋脚2基の構築作業及びA2橋台周辺の護岸復旧工事を進めています。
