

久居駅周辺まちづくり事業

久居駅(西口)駅前の整備完了
避難路の4月一部供用



平成31年3月8日

久居駅周辺まちづくり事業箇所

① 津市久居アルスプラザ整備事業
期間：H27年度～31年度

久居総合支所跡地に、久居市民会館に代わる新たな文化芸術拠点を整備



② まちづくり再生支援事業
期間：H27年度～30年度

(仮称)津市久居ホールの運営とホールを核とした文化によるまちづくりを、地域とともに検討する協議会を設置し、地域の再生等の話し合いを実施

③ 市道新町野口線道路改良事業
期間：H27年度～31年度

久居駅東口のロータリーまで拡幅された市道を、南側県道まで自転車歩行者道付道路として拡幅整備



④-1 久居駅東口広場・東口駐輪場・東口駐車場整備事業
期間：H27年度～31年度

久居駅東口広場の再整備に合わせ、駐輪場及び駐車場を新たに整備



④-2 久居駅(西口)駅前整備事業
期間：H27年度～30年度

利便性の向上を目的として車両通行レーンの入れ替え、及び高齢者、障がい者に配慮した駅前広場とするため、施設の改良を実施



⑤ 久居体育館ユニバーサルデザイン化事業
期間：H28年度～29年度

正面出入口の自動ドア化、トイレ、シャワー室等の改修を実施し、誰もが利用しやすい施設を整備



⑥ 久居交流広場整備事業
期間：H27年度～29年度

久居市民会館跡地に、災害時に一時避難場所としても活用できる市民交流広場を整備



⑦ 久居駅東口防災施設・耐震性貯水槽・防災備蓄倉庫整備事業
期間：H28年度～31年度


久居駅周辺利用者の災害時における支援活動などが円滑に行えるよう、駅東口に一時避難所等を整備



⑧ 避難路整備事業
期間：H27年度～31年度

老朽化した幹線水路の改修を行うとともに、災害時の避難路用通路として利用が出来るように整備

整備イメージ



久居駅(西口)駅前の整備完了

全体事業費 6,066万円

高齢者及び障がい者にも配慮した駅前広場へ

身体障がい者用乗降場の新設

- 噴水の跡地を活用し、上屋を設けた乗降場を新たに整備
- 身体障がい者の方が安全に乗降ができる場所を確保

待合所の改築

- 待合所の設置場所により、両側の歩道の幅員が狭く、安全な通行に支障が生じていた
- 屋根と壁の隙間により、雨の吹き込み、冬季における風の吹き込みがあり、利用に課題があった

県道上浜高茶屋久居線

一般車レーン

タクシーレーン

バスレーン

視覚障がい者誘導用ブロック新設及び改良

- ブロックが連続するように、新たに設置し延伸
- 弱視の方が認識しやすくなるように、黄色のブロックに改良

ポルタひさい

出入口

改札

近鉄久居駅



久居駅(西口)駅前の整備完了

身体障がい者用乗降場の新設

整備後



整備前



待合所の改築

整備後



整備前



視覚障がい者誘導用ブロックの新設及び改良



整備後



整備前



避難路整備事業(L=1,105m)

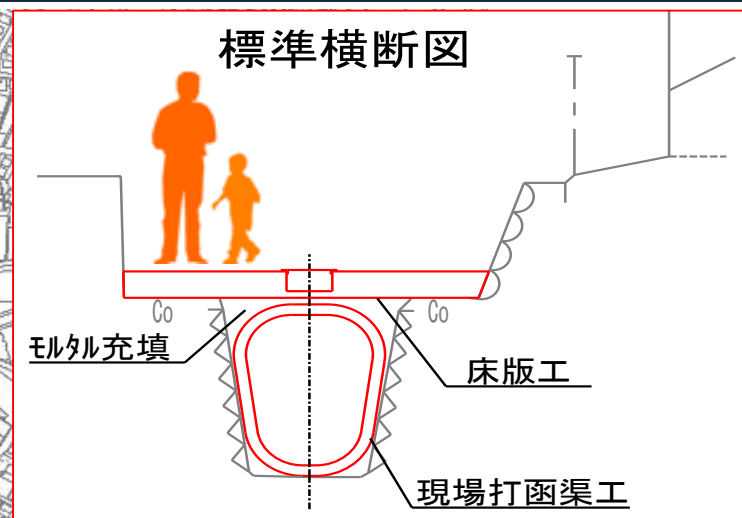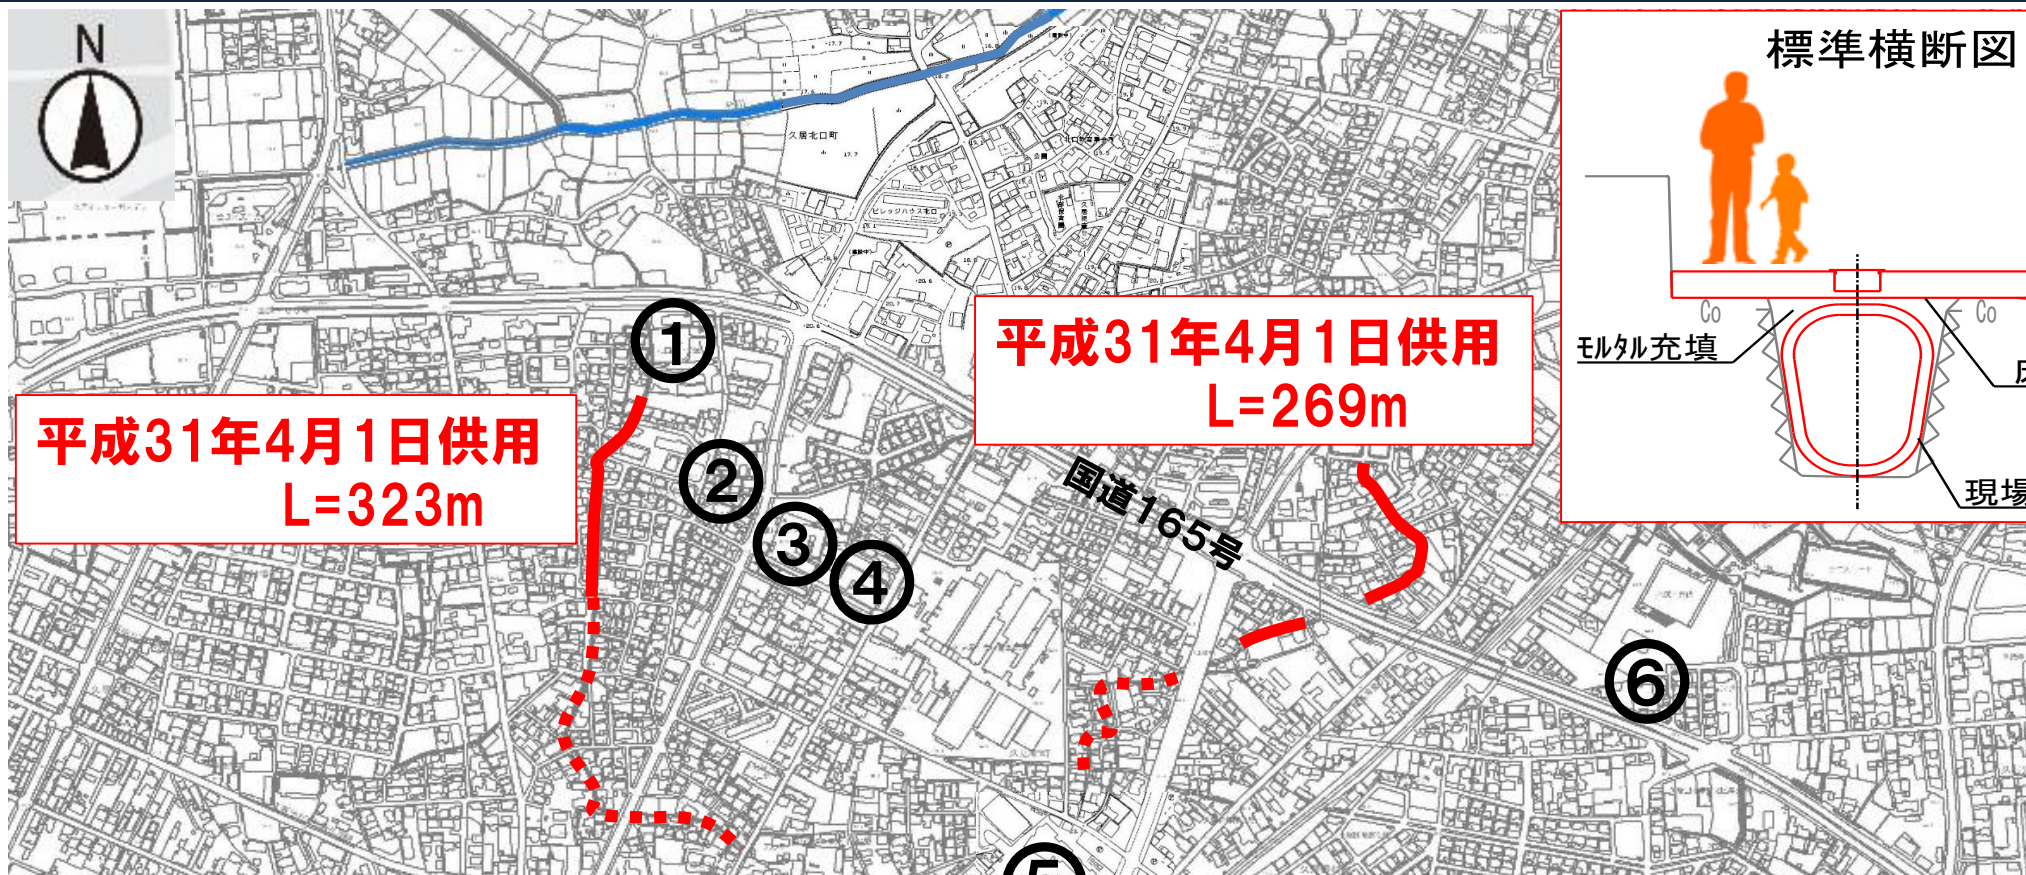

一時避難場所

- ① 北口第一公園
- ② 久居北口文化会館
- ③ 北口保育園
- ④ 密柑山幼稚園
- ⑤ 成美小学校グラウンド
- ⑥ 久居体育館駐車場

凡例

- 平成31年4月供用L=592m
- ⋯ 2020年4月供用 L=513m (予定)

避難路の整備(老朽化した幹線水路の暗渠化)

整備前

幹線水路



幹線水路の現況

- 水路の老朽化が進行し全面的な改修が必要
(昭和30年代後半から昭和40年代前半に整備)
- 水路両側の宅地化が進み改修工事が困難

整備中





整備後

避難路

幹線水路



成美地区の浸水対策

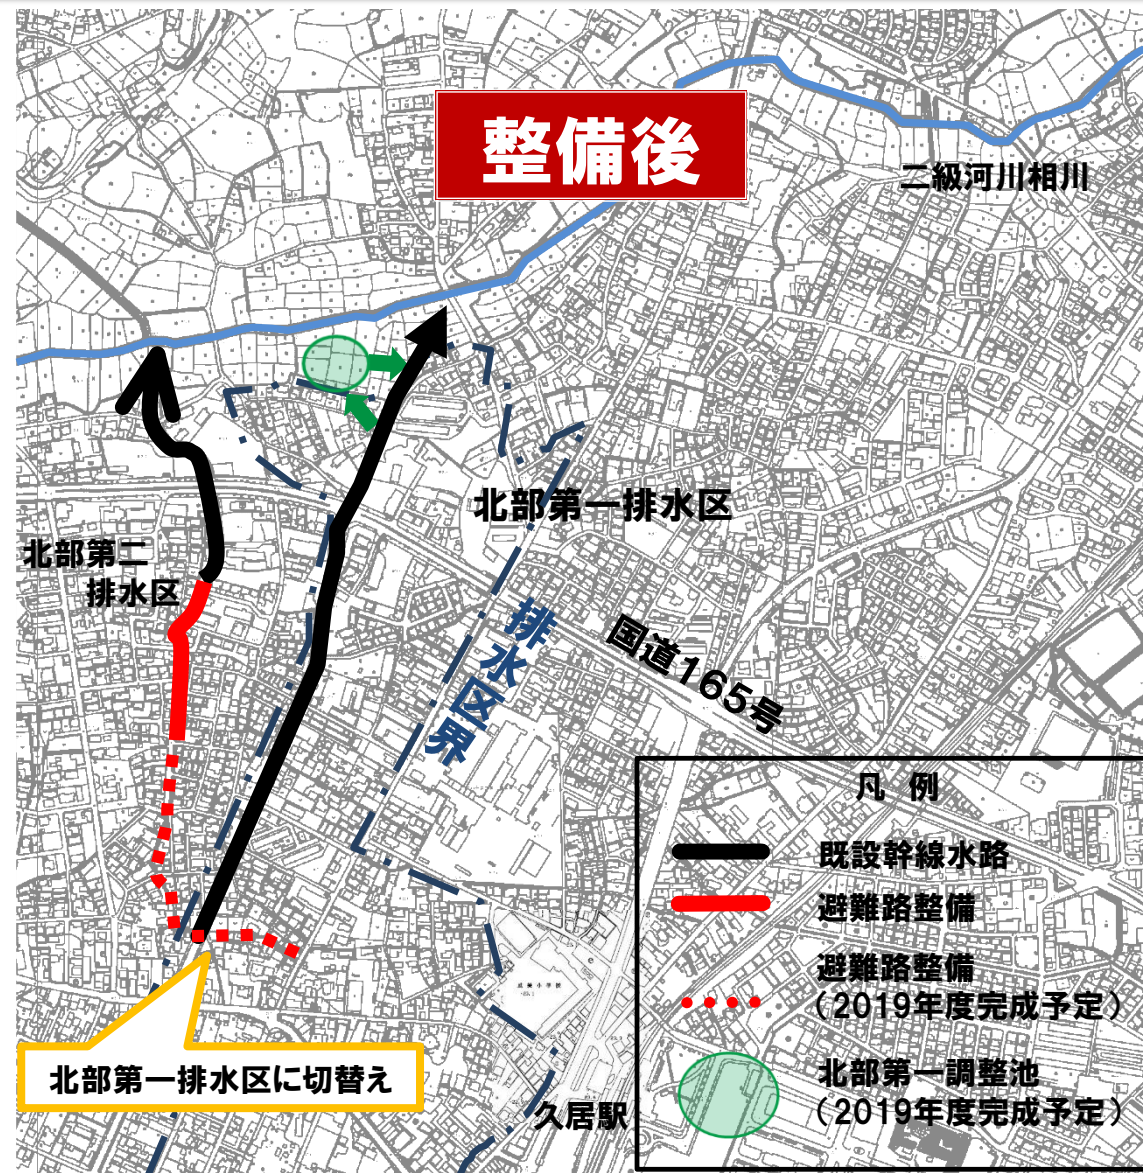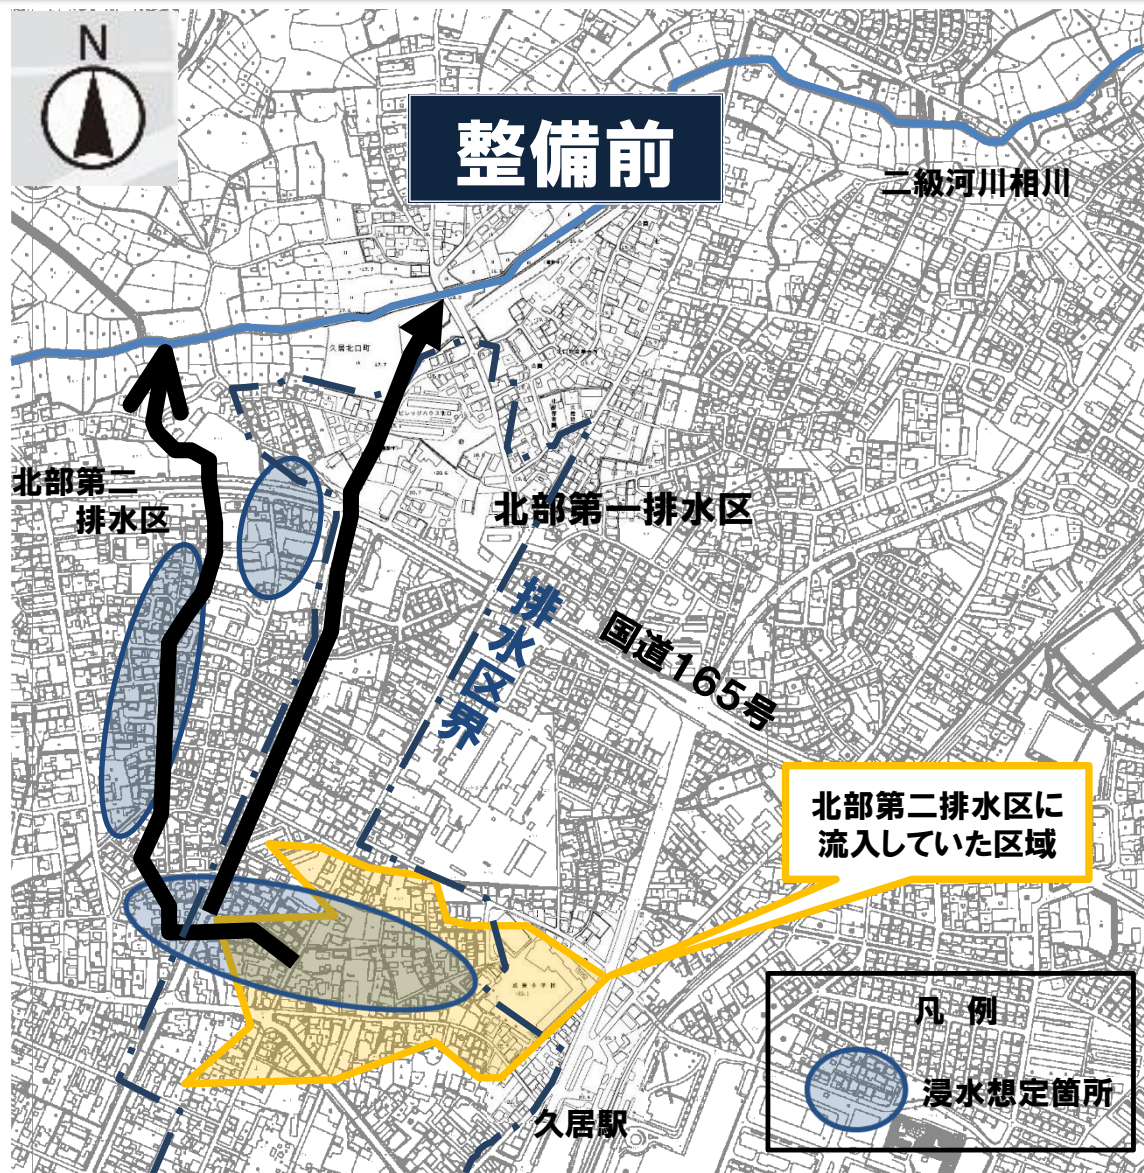

整備効果

- ・北部第一調整池の整備により北部第一排水区の浸水対策ができる
- ・排水区域の分離を行うことにより北部第二排水区の浸水対策ができる

平成31年度避難路整備事業費(予定)2億1,370万円

事業期間

平成27年度～平成31年度

総事業費

6億9,196万円

財政負担の軽減を図るため社会資本整備総合交付金及び公共事業等債を活用

整備延長

L=1,105m

年 度	内 容	事業費	財源内訳		
			国 費	起 債	一般財源
平成27年度	測量・設計業務 (L=1,105m) 完了	14,913	6,786	7,300	827
平成28年度	工事(L=113m) 完了	46,807	19,414	21,000	6,393
平成29年度	工事(L=243m) 完了	180,581	143,427	29,100	8,054
平成30年度	工事(L=341m) 施工中 工事完了 L = 697m 一部供用 L = 592m	235,960	119,259	95,200	21,501
平成31年度	工事(L=408m) 予定	213,700	13,800	175,500	24,400
合 計	整備延長 L=1,105m	691,961	302,686	328,100	61,175

単位：千円
