令和６年度下工公補継第１号　半田川田第２雨水幹線築造工事

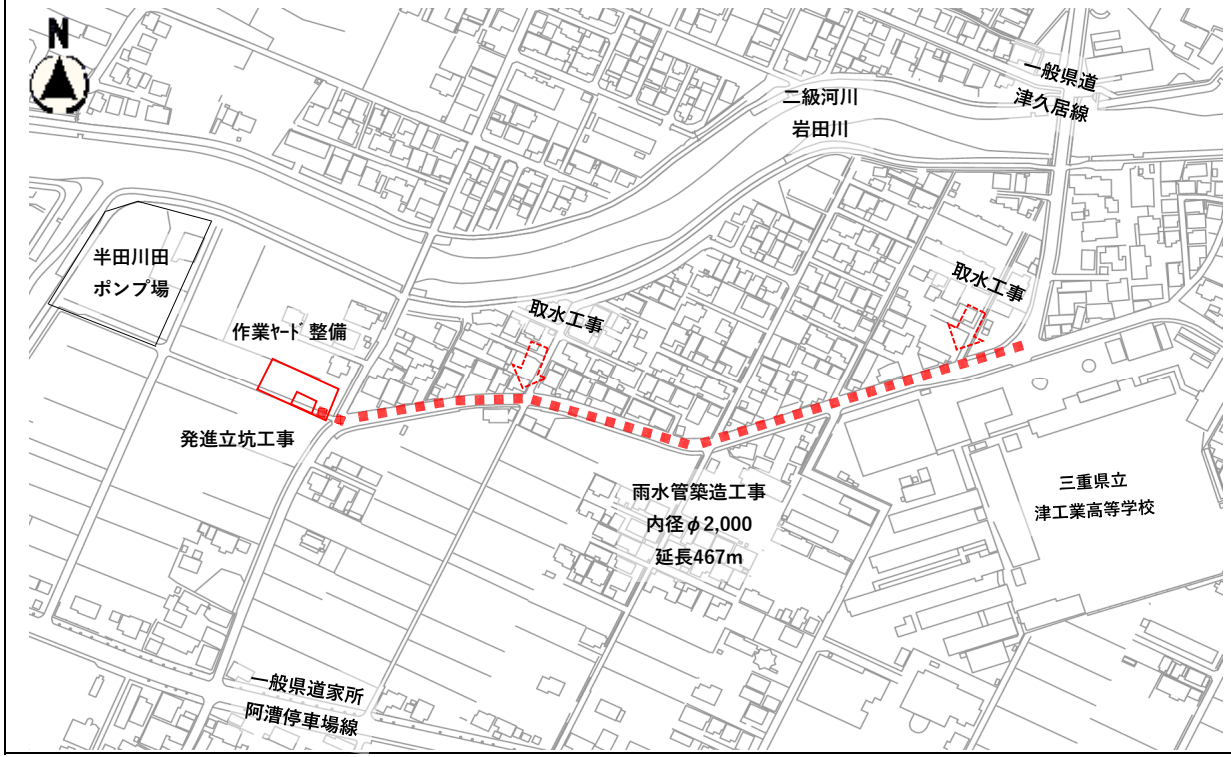

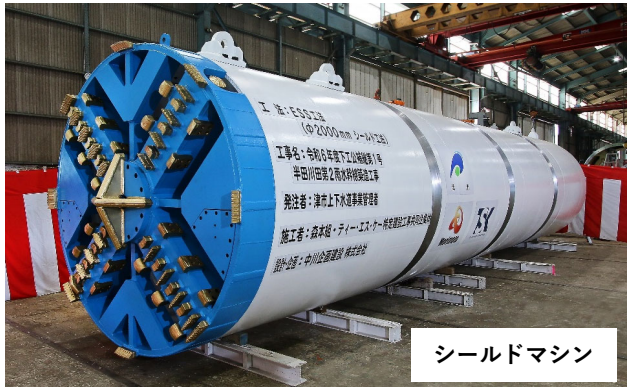

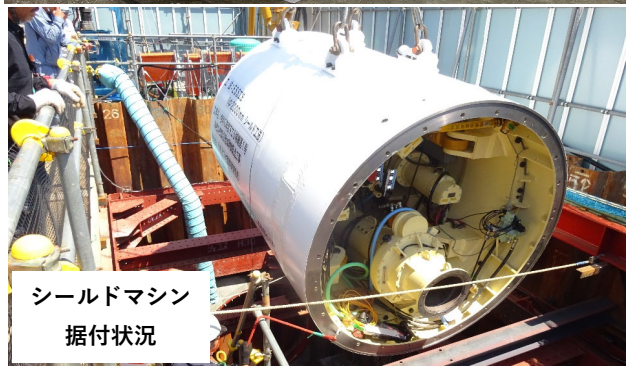

		令和６年度												令和７年度												令和８年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
準備・片付け工事 作業ﾔｰﾄﾞ整備 一式	計画																																				
	実施																																				
発進立坑工事　1箇所	計画																																				
	実施																																				
雨水管渠築造工事 内径φ2,000mm 延長467m	計画																																				
	実施																																				
取水工事 2箇所 ﾏﾝﾎｰﾙ築造工事 2箇所	計画																																				
	実施																																				
